


Bauablauf

So wird die Lichtwiesenbahn gebaut




Bauphase 1

(18. November 2019 bis 3. Juni 2020)
In dieser Phase wird die Trasse am Lichtwiesenweg hergestellt und erste Arbeiten für die neue Haltestelle „Kletterhalle“ durchgeführt. Außerdem beginnen die Arbeiten für die Wendeschleife an der Mensa. Ab Ende März 2020 starten die Bauarbeiten für die Verlegung der Haltestelle „Hochschulstadion“ an der Nieder-Ramstädter Straße.

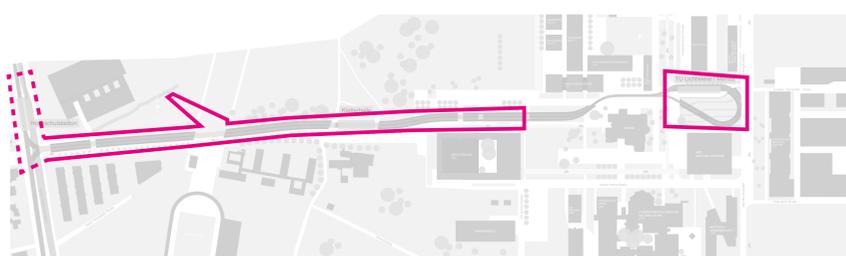

Bauphase 2

(4. Juni bis 5. Juli 2020)
In dieser Phase werden die Bauarbeiten am Gleisdreieck Nieder-Ramstädter Straße vorbereitet. Zusätzlich beginnen die Bauarbeiten für die Trasse nördlich der Mensa. An den Haltestellen „Hochschulstadion“, „Kletterhalle“ und an der Wendeschleife werden die Bauarbeiten fortgesetzt.

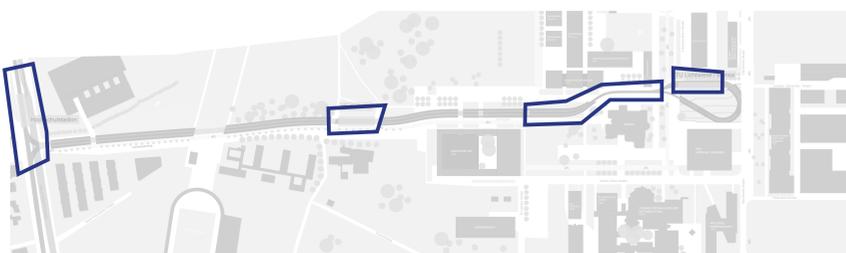

Bauphase 3

(6. Juli bis 14. August 2020)
In den Sommerferien 2020 wird vor allem das Gleisdreieck an der Nieder-Ramstädter Straße hergestellt. Daneben finden Bauarbeiten an der Haltestelle „Kletterhalle“, an der Trasse nördlich der Mensa und an der Wendeschleife statt.



Bauphase 4

(15. August bis 16. Oktober 2020)
In dieser Phase wird der Verbindungsweg zwischen Georg-Büchner-Schule und Hochschulstadion fertiggestellt. Des Weiteren finden Arbeiten an der Wendeschleife statt und an der Trasse nördlich der Mensa. Zusätzlich wird die verlegte Haltestelle „Hochschulstadion“ fertig gestellt.



Bauphase 5

(17. Oktober 2020 bis 3. Juni 2021)
In der letzten Phase wird die Haltestelle „Kletterhalle“ sowie die Trasse nördlich der Mensa und die Haltestelle „TU Lichtwiese/Mensa“ fertig gestellt.

